


PLAN SCRUM – EventPlanner.web
EventPlanner.web
Análisis y desarrollo de Software -- ADSO
Leider Maza Taboada Alejandro vera Leider Manuel Diaz
SENA – Centro para la Industria Petroquímica
Inst. Mara S. Cabrales
Índice
Flujo de trabajo y control de versiones
Definition of done
Product backlog
Sprint backlog
Casos de pruebas

Daily Scrum
Sprint review
Sprint Retrospective

Flujo de trabajo y control de versiones	
Repositorio utilizado:	Github
Nombre del proyecto:	EventPlanner.web
Metodologia de trabajo:	SCRUM
Herramienta de control de versiones:	Git
Repositorio remoto:	GitHub
Herramienta de desarrollo:	Visual Studio 2022

Convención de commits
feat: registro de aprendices
feat: gestión de eventos
fix: validación de correo institucional
fix: corrección de inscripción por equipos
docs: actualización de documentación Scrum
report: creación de reporte de eventos activos

Integrante	Rol
Leider Maza Taboada	Scrum Master / Desarrollador
Alejandro Vera	Desarrollador
Leider Manuel Díaz	Desarrollador

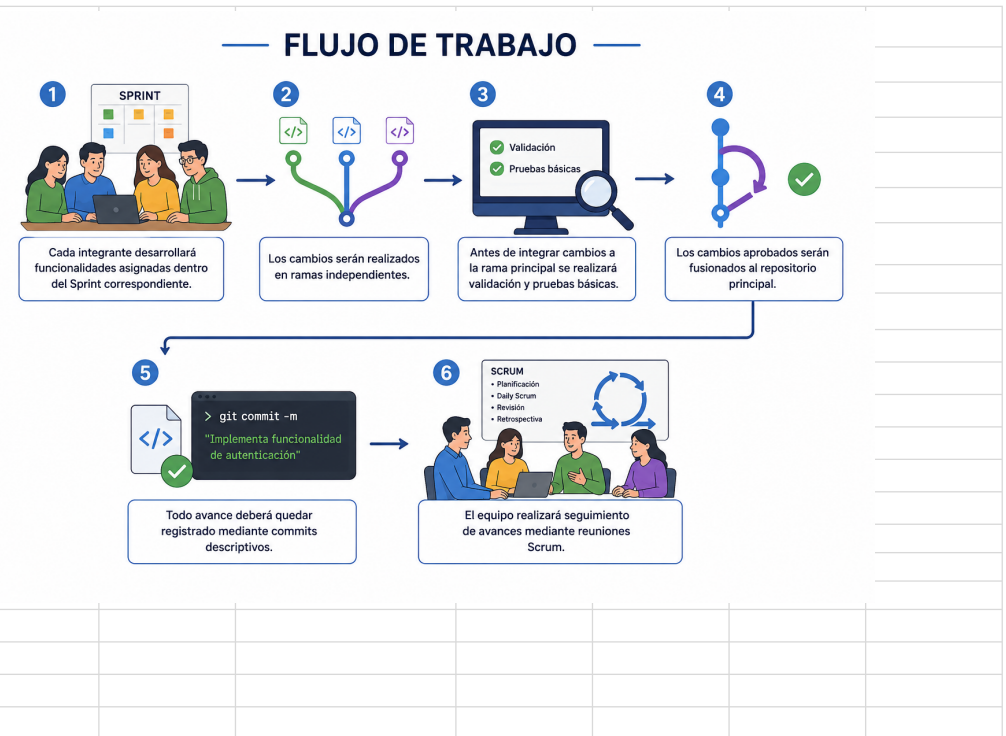

Definition of Done	
ID	Criterio
DoD-01	La funcionalidad cumple los requisitos definidos en la historia de usuario
DoD-02	El código compila sin errores
DoD-03	Las validaciones requeridas funcionan correctamente
DoD-04	La funcionalidad fue probada por el equipo
DoD-05	Los datos se almacenan correctamente en SQL Server
DoD-06	La interfaz mantiene el diseño establecido con Bootstrap
DoD-07	Se realizaron pruebas de entradas válidas e inválidas
DoD-08	Los cambios fueron registrados mediante commits en GitHub
DoD-09	No se generan errores de ejecución durante las pruebas
DoD-10	La funcionalidad está lista para demostración en Sprint Review
La Definition of Done establece los criterios mínimos que debe cumplir una funcionalidad para considerarse terminada y apta para ser presentada durante la revisión del Sprint.	

PRODUCT BACKLOG-EventPlanner.web		Estado	Significado			
		Backlog	Pendiente de iniciar			
		To Do	Planificado para el Sprint actual			
		In Progress	En desarrollo			
		Testing	En pruebas			
		Done	Terminado y aprobado			
ID RF	Épica	Historia de Usuario	Descripción	SP	Sprint	Estado
RF-01	Autenticación	Como aprendiz quiero registrarme para acceder al sistema	Permite registrar nuevos aprendices con correo institucional	5	Sprint 1	Backlog
RF-02	Autenticación	Como usuario quiero iniciar sesión según mi rol	Permite acceso como administrador o aprendiz	5	Sprint 1	Backlog
RF-03	Gestión de Eventos	Como administrador quiero crear eventos	Permite registrar eventos académicos, deportivos o culturales	8	Sprint 2	Backlog
RF-04	Gestión de Eventos	Como administrador quiero editar eventos	Permite actualizar la información de eventos	5	Sprint 2	Backlog
RF-05	Gestión de Eventos	Como administrador quiero eliminar eventos	Permite eliminar eventos existentes	3	Sprint 2	Backlog
RF-06	Gestión de Eventos	Como administrador quiero activar o desactivar eventos	Permite controlar la disponibilidad de eventos	3	Sprint 2	Backlog
RF-07	Gestión de Eventos	Como administrador quiero programar fechas de inscripción	Permite definir apertura y cierre de inscripciones	5	Sprint 2	Backlog
RF-08	Equipos	Como administrador quiero crear equipos para eventos grupales	Permite administrar grupos de participantes	5	Sprint 3	Backlog
RF-09	Consulta de Eventos	Como aprendiz quiero visualizar eventos disponibles	Permite consultar eventos activos	3	Sprint 3	Backlog
RF-10	Inscripciones	Como aprendiz quiero inscribirme a eventos individuales	Permite participar en eventos individuales	8	Sprint 3	Backlog
RF-11	Inscripciones	Como aprendiz quiero seleccionar un equipo en eventos grupales	Permite unirse a un equipo disponible	8	Sprint 3	Backlog
RF-12	Inscripciones	Como aprendiz quiero cancelar mi inscripción	Permite liberar un cupo reservado	3	Sprint 3	Backlog
RF-13	Validaciones	Como sistema quiero validar cruces de horario	Evita inscripciones en eventos con horarios superpuestos	13	Sprint 3	Backlog
RF-14	Validaciones	Como sistema quiero controlar cupos disponibles	Impide superar la capacidad máxima del evento	8	Sprint 3	Backlog
RF-15	Consultas	Como administrador quiero consultar aprendices inscritos	Permite visualizar participantes por evento	5	Sprint 4	Backlog
RF-16	Reportes	Como administrador quiero generar reporte de eventos	Permite visualizar eventos activos e inactivos	5	Sprint 4	Backlog
RF-17	Reportes	Como administrador quiero generar reporte de inscripciones	Permite visualizar inscritos por evento	5	Sprint 4	Backlog
RF-18	Validaciones UI	Como usuario quiero recibir validaciones en tiempo real	Evita errores antes de enviar formularios	8	Sprint 4	Backlog
RF-19	Dashboard	Como administrador quiero visualizar indicadores generales	Permite consultar métricas del sistema	5	Sprint 4	Backlog
RF-20	Chatbot IA	Como usuario quiero recibir ayuda mediante chatbot	Permite resolver dudas sobre el sistema	8	Sprint 4	Backlog

Sprint Backlog-EventPlanner.web								
Sprint 0								
Objetivo: Preparar toda la documentación y diseño del proyecto.								
Sprint	ID RF	Actividad	Responsable	Estado	fecha y hora terminado			
Sprint 0	RF-00	Crear proyecto MVC	Leider Maza	Done	05/06/26 - 7:27AM			
Sprint 0	RF-00	Organizar estructura de carpetas	Leider Maza	Done	05/06/26 - 9:56AM	Estado	Significado	
Sprint 0	RF-00	Diseñar modelo relacional	Leider Maza	Done	05/06/26 - 10:41AM	Backlog	Pendiente de iniciar	
Sprint 0	RF-00	Elaborar diccionario de datos	Leider Maza	Done	05/06/26 - 11:33AM	To Do	Planificado para el Sprint actual	
Sprint 0	RF-00	Elaborar Product Backlog	Leider Maza/ Alejandro vera	Done	05/06/26 - 3:18 PM	In Progress	En desarrollo	
Sprint 0	RF-00	Elaborar Sprint Backlog	Leider Maza	Done	05/06/26 - 4:08 PM	Testing	En pruebas	
Sprint 0	RF-00	Elaborar Plan SQA inicial(una parte)	Leider Maza	Done	05/06/26 - 5:52 PM	Done	Terminado y aprobado	
Sprint 0	TEC-01	Crear Base de Datos SQL Server	Equipo(Leider,Leider.M,Alejandro)	Backlog				
Sprint 0	TEC-02	Crear tablas y relaciones	Equipo(Leider,Leider.M,Alejandro)	Backlog				
Sprint 0	TEC-03	Insertar datos iniciales	Equipo(Leider,Leider.M,Alejandro)	Backlog				
Sprint 0	TEC-04	Configurar conexión MVC - SQL Server	Equipo(Leider,Leider.M,Alejandro)	Backlog				
Sprint 1								
Objetivo: Permitir el acceso y registro de usuarios.								
Sprint	ID RF	Actividad	Responsable	Estado	fecha y hora terminado			
Sprint 1	RF-01	Registro de aprendices	Alejandro Vera	Backlog				
Sprint 1	RF-02	Inicio de sesión	Leider Manuel Díaz	Backlog				
Sprint 1	RF-18	Validaciones de formularios	Leider Maza	Backlog				
Sprint 1	RF-01	Validación de correo institucional	Alejandro Vera	Backlog				
Sprint 2								
Objetivo:Administrar eventos desde el rol administrador.								
Sprint	ID RF	Actividad	Responsable	Estado	fecha y hora terminado			
Sprint 2	RF-03	Crear eventos	Leider Maza	Backlog				
Sprint 2	RF-04	Editar eventos	Alejandro Vera	Backlog				
Sprint 2	RF-05	Eliminar eventos	Leider Manuel Díaz	Backlog				
Sprint 2	RF-06	Activar/Desactivar eventos	Alejandro Vera	Backlog				
Sprint 2	RF-07	Programar fechas de inscripción	Leider Maza	Backlog				
Sprint 3								
Objetivo:Gestionar inscripción de aprendices y equipos.								
Sprint	ID RF	Actividad	Responsable	Estado	fecha y hora terminado			
Sprint 3	RF-08	Crear equipos	Leider Manuel Díaz	Backlog				
Sprint 3	RF-09	Visualizar eventos disponibles	Alejandro Vera	Backlog				
Sprint 3	RF-10	Inscripción individual	Leider Maza	Backlog				
Sprint 3	RF-11	Inscripción por equipos	Alejandro Vera	Backlog				
Sprint 3	RF-12	Cancelar inscripción	Leider Manuel Díaz	Backlog				

Sprint 3	RF-13	Validar cruces de horario	Leider Maza	Backlog			
Sprint 3	RF-14	Control de cupos	Leider Manuel Diaz	Backlog			
Sprint 4 Objetivo:Generar reportes y preparar la entrega.							
Sprint	ID RF	Actividad	Responsable	Estado	fecha y hora terminado		
Sprint 4	RF-15	Consultar inscritos	Alejandro Vera	Backlog			
Sprint 4	RF-16	Reporte de eventos	Leider Maza	Backlog			
Sprint 4	RF-17	Reporte de inscripciones	Leider Manuel Diaz	Backlog			
Sprint 4	RF-19	Dashboard administrativo	Alejandro Vera	Backlog			
Sprint 4	RF-20	Integración Chatbot IA	Leider Maza	Backlog			
Sprint 4	SQA-01	Pruebas finales	Equipo	Backlog			
Sprint 4	SQA-02	Ajustes finales	Equipo	Backlog			
Sprint 4	RF-00	Sustentación	Equipo	Backlog			

Estrategia SQA			
Elemento	Descripción		
Objetivo SQA	Garantizar que el sistema EventPlanner.Web cumpla los requisitos funcionales y no funcionales definidos, asegurando calidad, confiabilidad, seguridad y correcto funcionamiento antes de la entrega final.		
Alcance	Se evaluarán los módulos de autenticación, gestión de eventos, gestión de equipos, inscripciones, validaciones, reportes y chatbot IA.		
Estándares de calidad	Se utilizará como referencia la norma ISO/IEC 25010 para evaluar atributos de calidad como fiabilidad, usabilidad, rendimiento, compatibilidad y seguridad funcional. Adicionalmente se emplearán ASP.NET MVC, SQL Server, Bootstrap, GitHub y Scrum como tecnologías y metodologías de desarrollo.		
Tipos de prueba	Pruebas funcionales, pruebas de validación de datos, pruebas de integración con base de datos, pruebas de interfaz de usuario, pruebas de reportes y pruebas de chatbot IA.		
Responsables	Leider Maza Taboada, Alejandro Vera y Leider Manuel Díaz serán responsables de ejecutar pruebas, documentar resultados y corregir incidencias encontradas.		
Evidencias	Sera evidenciado en Capturas de pantalla, resultados de casos de prueba, reportes generados, registros de commits en GitHub y evidencias de ejecución del sistema.		
Métricas	Número de casos de prueba ejecutados, porcentaje de casos aprobados, número de incidencias detectadas y corregidas, cumplimiento de requisitos funcionales y no funcionales.		
Criterios de aceptación	El sistema debe cumplir el 100% de los requisitos funcionales, validar correctamente las entradas de usuario, almacenar información correctamente en SQL Server, generar reportes sin errores y permitir la navegación adecuada para administradores y aprendices.		
Criterio	Descripción		
Fiabilidad	El sistema debe funcionar sin errores durante su ejecución.		
Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva y fácil de utilizar. Interfaz Bootstrap clara		
Rendimiento	Los tiempos de respuesta deben ser adecuados.		
Seguridad funcional	Las validaciones deben impedir entradas incorrectas.		
Compatibilidad	La integración con SQL Server debe funcionar correctamente.		
Integración externa	Crystal Reports y Chatbot IA deben operar correctamente.		
Métrica	Cómo se evidencia		
Casos de prueba ejecutados	Tabla de casos de prueba		
Casos aprobados	Casos marcados como Aprobado		
Casos fallidos	Casos marcados como Fallido		
Requisitos implementados	Product Backlog + Sprint Backlog		
Incidencias encontradas	Observaciones de pruebas		
Incidencias corregidas	Evidencia posterior a la corrección		
Commits realizados	Historial GitHub		

Casos de Prueba - EventPlanner.Web										

[illegible]

Sprint Retrospective - EventPlanner.web				
		Sprint 0		
		Sprint	¿Qué salió bien?	¿Qué se puede mejorar?
		Sprint 0	Se completó la documentación inicial, modelo relacional, Product Backlog, Sprint Backlog y Estrategia SQA	Distribuir más actividades entre los integrantes desde el inicio
				Acción para el siguiente Sprint
		Sprint 1		
		Sprint	¿Qué salió bien?	¿Qué se puede mejorar?
		Sprint 2		
		Sprint	¿Qué salió bien?	¿Qué se puede mejorar?
				Acción para el siguiente Sprint
		Sprint 3		
		Sprint	¿Qué salió bien?	¿Qué se puede mejorar?
		Sprint 4		
		Sprint	¿Qué salió bien?	¿Qué se puede mejorar?
				Acción para el siguiente Sprint
